


CF式ガス機器の施工チェックシート

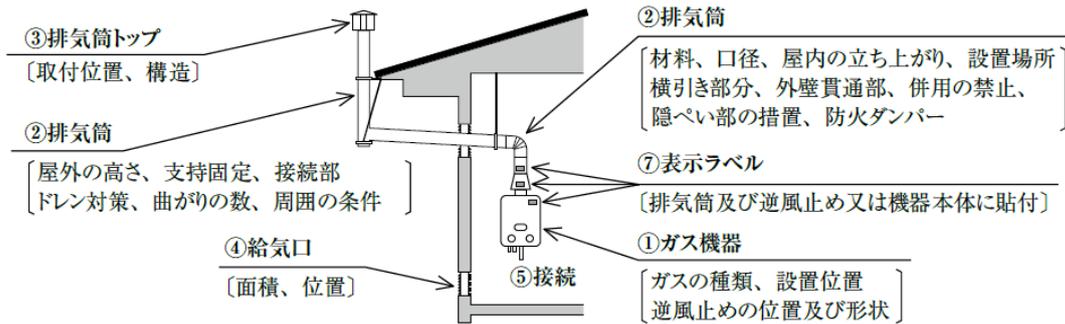

CF式ガス機器の施工チェック表

チェック項目		チェックの要点	チェック欄
① ガス機器	ガスの種類	供給されているガス種と適合しているか	
	設置位置	防火上の離隔距離はよいか	
		メンテナンススペースはあるか	
		設置場所は適正か	
逆風止めの位置及び形状	逆風止めは同一室内で、形状を変更していないか		
② 排気筒	材料	認証表示品を使用しているか	
	口径	縮小されていないか	
	屋内の立ち上がり	逆風止め直上部は、できるだけ長くされているか	
	設置場所	点検及び維持管理は容易か	
	横引き部分	横引きの長さは原則5m以下で、先上がり勾配になっているか	
	屋外の高さ	原則10m以下で、高さの計算式で求めた値以上か	
	支持固定	堅固に取り付けられているか	
	接続部	容易に外れないよう抜け出し防止措置が講じられているか	
	ドレン対策	ドレン排出用T字管が使用されているか	
	曲がりの数	4箇所以内か	
	周囲の条件	防火上の離隔距離又は、有効に断熱措置されているか	
	外壁貫通部	外壁貫通部は、有効な処理がしてあるか	
	併用の禁止	換気ダクト等と併用していないか	
	隠ぺい部の措置	金属以外の不燃材料で有効に断熱措置されているか 点検口はあるか	
防火ダンパー	防火ダンパーは取り付けられていないか		
③ 排気筒トップ	取付位置	屋外に出ているか	
		風圧の影響を受けない位置か	
		屋根面からの垂直距離は60cm以上あるか	
構造	認証表示品を使用しているか		
④ 給気口	面積	排気筒断面積以上の有効断面積であるか	
	位置	外気に通ずる所にあるか	
⑤ 接続	ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか		
⑥ 試運転	取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか		
⑦ 表示ラベル	表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか		
⑧ お客さま説明	ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか		
