


F E式ガス機器の施工チェックシート

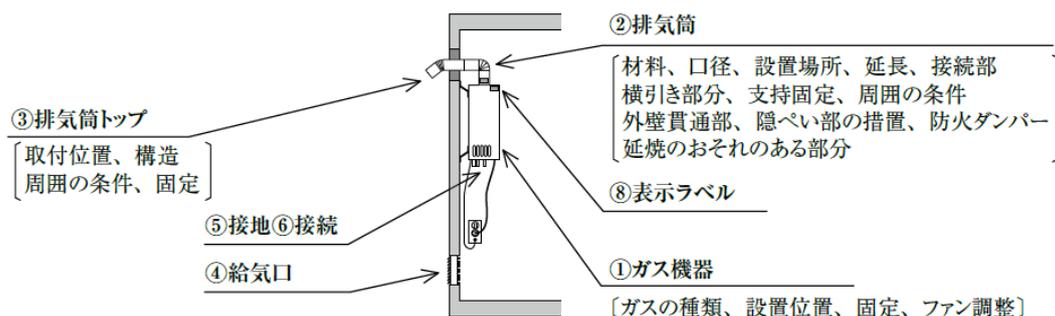

F E式ガス機器の施工チェック表

チェック項目		チェックの要点	チェック欄
①ガス機器	ガスの種類	供給されているガス種と適合しているか	
	設置位置	腐食性ガス等が発生させるおそれのある室でないか	
		防火上の離隔距離はよいか	
		メンテナンススペースはあるか	
	固定	水平に設置され、堅固に固定されているか	
ファン調整	排気筒の延長距離に応じて調整をしたか		
②排気筒	材料	認証表示品を使用しているか（ロック機構付が望ましい）	
	口径	設置工事説明書によっているか	
	設置場所	点検及び維持管理は容易か	
	延長	設置工事説明書の最大延長距離及び曲がり数以内か	
		横引き部は、先下がり勾配になっているか	
		ドレンが溜まるようなたるみはないか	
	接続部	容易に外れないよう防止措置が講じられているか	
		差し込み式排気筒は、接続部に耐熱性シール剤を塗布してあるか	
	支持固定	堅固に固定されているか	
		1.5m ~2m間隔で支持固定されているか	
	周囲の条件	防火上の離隔距離又は、有効に断熱措置されているか	
	外壁貫通部	排気筒と外壁貫通部との間に隙間はないか	
	隠ぺい部の措置	金属以外の不燃材料で有効に断熱措置されているか	
		点検口はあるか	
防火ダンパー	防火ダンパーは取り付けられていないか		
延焼のおそれのある部分	有効な断熱措置が講じられているか		
③排気筒トップ	取付位置	屋外に出ており、燃焼排ガスが滞留しない場所か	
	構造	認証表示品を使用しているか	
	周囲の条件	可燃物や開口部との離隔距離は基準値以上あるか	
④給気口	排気筒断面積以上の有効断面積であるか		
⑤接地	接地(アース)は正しく接続してあるか		
⑥接続	ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか		
⑦試運転	取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか		
⑧表示ラベル	表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか		
⑨お客さま説明	ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか		
