


BF-W式ガス機器の施工チェックシート

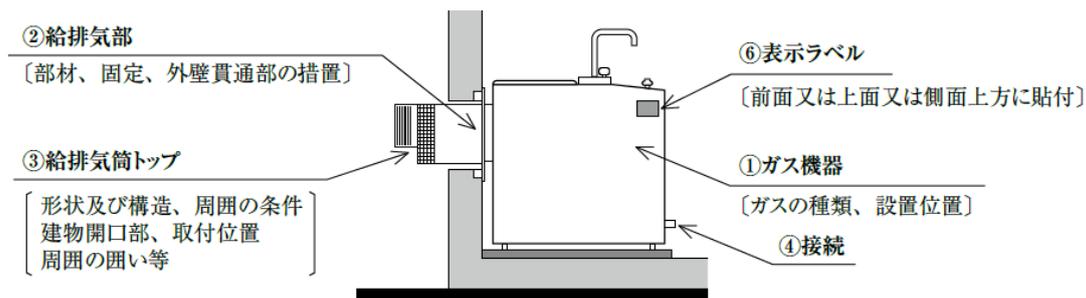

BF-W式ガス機器の施工チェック表

チェック項目		チェックの要点	チェック欄
① ガス機器	ガスの種類	供給されているガス種と適合しているか	
	設置位置	防火上の離隔距離はよいか	
		水の溜まる位置に設置していないか	
		ガスふろがま本体、循環管及び浴槽は、適切な位置であるか	
		メンテナンススペースが確保されているか	
② 給排気部	固定	堅固に固定されているか ガス機器と給排気部は確実に接続されているか	
	部材	当該ガス機器用のものが使用されているか	
	外壁貫通部の措置	給排気部と外壁貫通部との間に燃焼排ガスが屋内に流れ込む隙間がないか	
③ 給排気筒トップ	形状及び構造	当該ガス機器用のものが使用され、形状及び構造が変更されていないか	
	周囲の条件	可燃物及び障害物とは離隔距離がとられているか	
	建物開口部	建物開口部と給排気筒トップとの離隔距離はよいか	
	取付位置	屋外に出ているか	
		外壁の厚みに合ったものか へこみ取付またはくぼみ取付がされていないか	
周囲の囲い等	給排気の妨げとなる囲い又は障害物が設置されていないか		
④接続	ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか		
⑤試運転	取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか		
⑥表示ラベル	表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか		
⑦お客さま説明	ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか		
