


# FF-W式（給排気延長）ガス機器の施工チェックシート

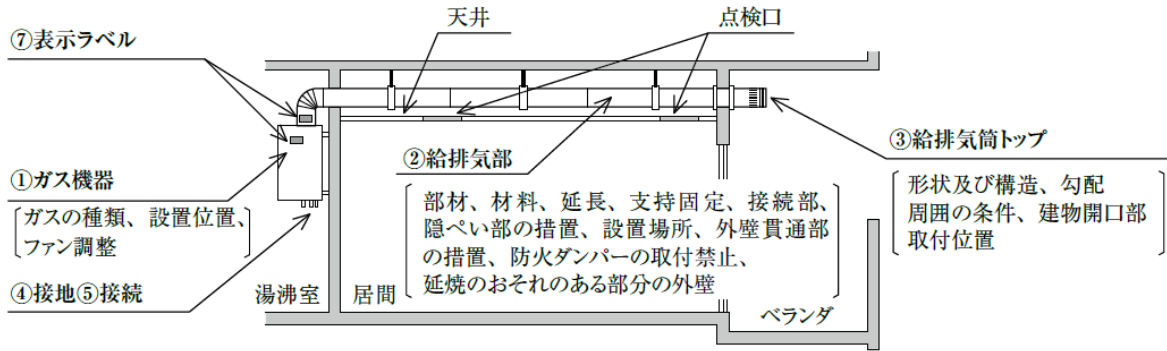

## FF-W式（給排気延長）ガス機器の施工チェック表

チェック項目		チェックの要点	チェック欄	
① ガス機器	ガスの種類	供給されているガス種と適合しているか		
	設置位置	防火上の離隔距離はよいか		
		水平に設置され堅固に固定されているか		
		メンテナンススペースはあるか		
ファン調整	給排気筒の延長距離に応じて調整をしたか			
② 給排気部	部材	当該ガス機器用のものか		
	材料	二重管	給排気管は、SUS304 又はこれと同等以上のものか	
		二本管	排気管は、SUS304 又はこれと同等以上のものか	
	延長	設置工事説明書に記載されている最大延長距離及び曲がりの数以内か		
		先下がり勾配か		
		長さ調整に、スライド管が使用されているか		
	支持	固定堅固に取り付けられているか		
		固定金具は、給排気管又は排気管と同等以上のものか		
		原則として1.5m ~2m間隔で固定されているか		
	接続部	ロック機構付は正しくロックされているか		
		差し込み式は、十分に差し込まれ、リベット等で抜け出し防止措置が講じられているか		
		接続部に耐熱性シール剤を塗布されているか		
	隠ぺい部の措置	断熱措置が講じられているか		
点検口が設けられているか				
設置場所	点検及び維持・管理が容易にできるか			
外壁貫通部の措置	燃焼排ガスが屋内に流れ込む隙間はないか			
防火ダンパーの取付禁止	防火ダンパー等を取り付けていないか			
延焼のおそれのある部分の外壁	有効な断熱措置が講じられているか			
③ 給排気筒トップ	形状及び構造	当該ガス機器用のものが使用されているか		
	勾配	先下がり勾配か		
	周囲の条件	囲い等が設置されていないか		
		障害物とは、基準値以上の離隔距離がとられているか 防火上の離隔距離はよいか		
	建物開口部	給排気筒トップとの離隔距離が基準値以上であるか		
取付位置	屋外に出ているか			
④接地	接地(アース)は正しく接続してあるか			
⑤接続	ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか			
⑥試運転	取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか			
⑦表示ラベル	表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか			
⑧お客さま説明	ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか			
